
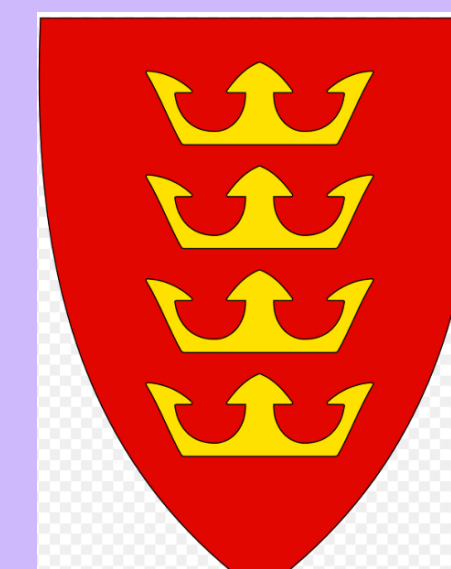
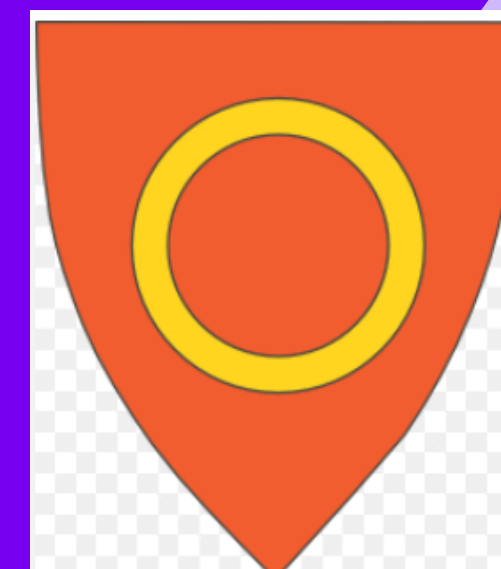


Vekst og planbarometer for Ringerike, Hole og Jevnaker

Svend Henrik Vinje Ringerike kommune
Steinar Aasnæss USN

USN, Campus Hønefoss

02.05.25

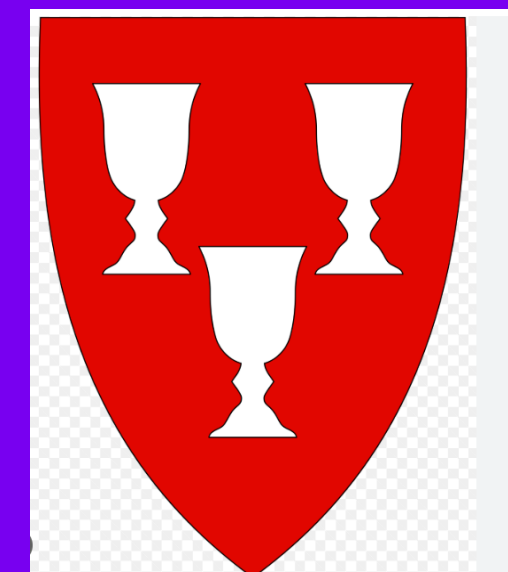

Forskjell på gode og dårlige planprosesser



Foto: Tronrud Eiendom




Formålet med planbarometeret:

- Bidra til gode og effektive planprosesser
- Styrke samhandlingen mellom kommunen, tiltakshavere og de folkevalgte



Målgruppen for panbarometeret:

- Primærmålgruppe vil være tiltakshaver, folkevalgte og kommunene
- Planbarometeret er også tilgjengelige for allmenheten

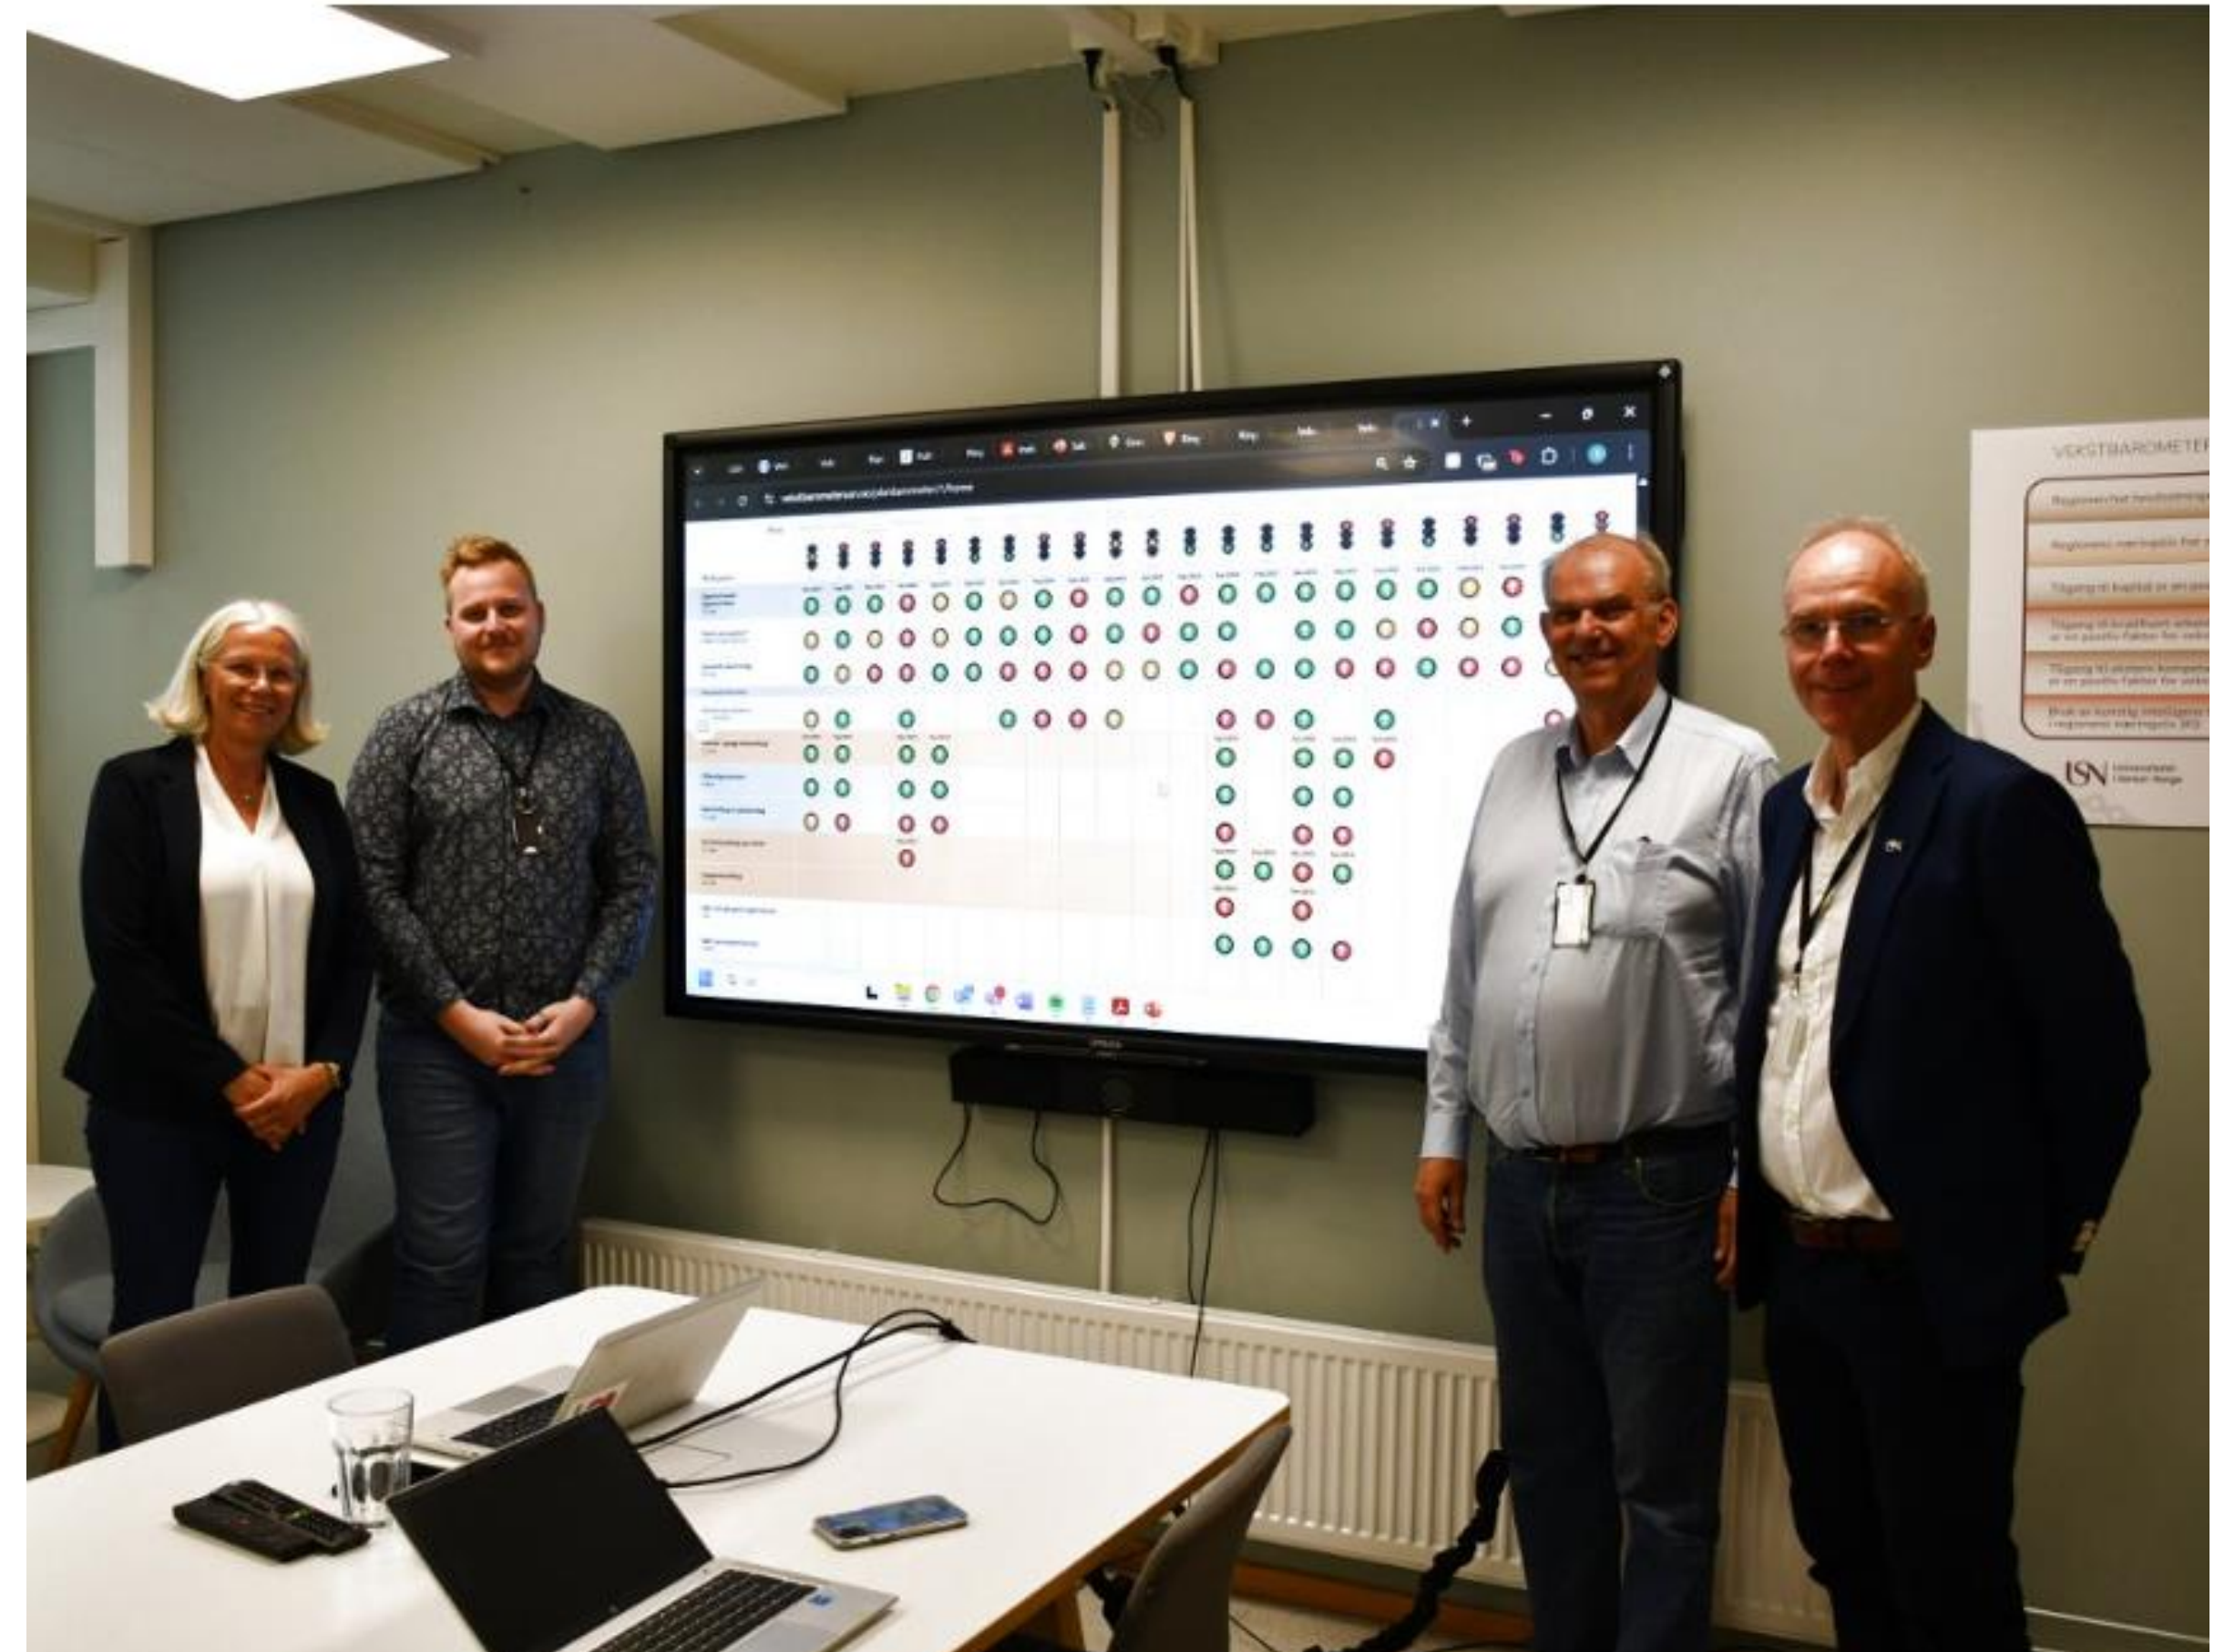

Arbeidsform


- Fortløpende oppdateringer fra kommunene
- Kvartals vise konsensusmøter
- Planbarometeret driftes av studenter ved USN
- USN leder og fasiliteter konsensusgruppen
- Prosjekt på tre år

Konsensusgruppen:


<i>Kommune:</i>	<i>Folkevalgt:</i>	<i>Administrasjon:</i>	<i>Tiltakshaver:</i>
Ringerike	Runar Johansen	Svend Henrik Vinje	Ellen Grønlund
Jevnaker		Martin Granheim	Jon – Petter Sandvold
Hole	Elisabeth Klever	Heidi Bergom	Åshild Lie HRP

Vekst og planbarometer for Ringeriksregionen

vekstbarometerusn.no

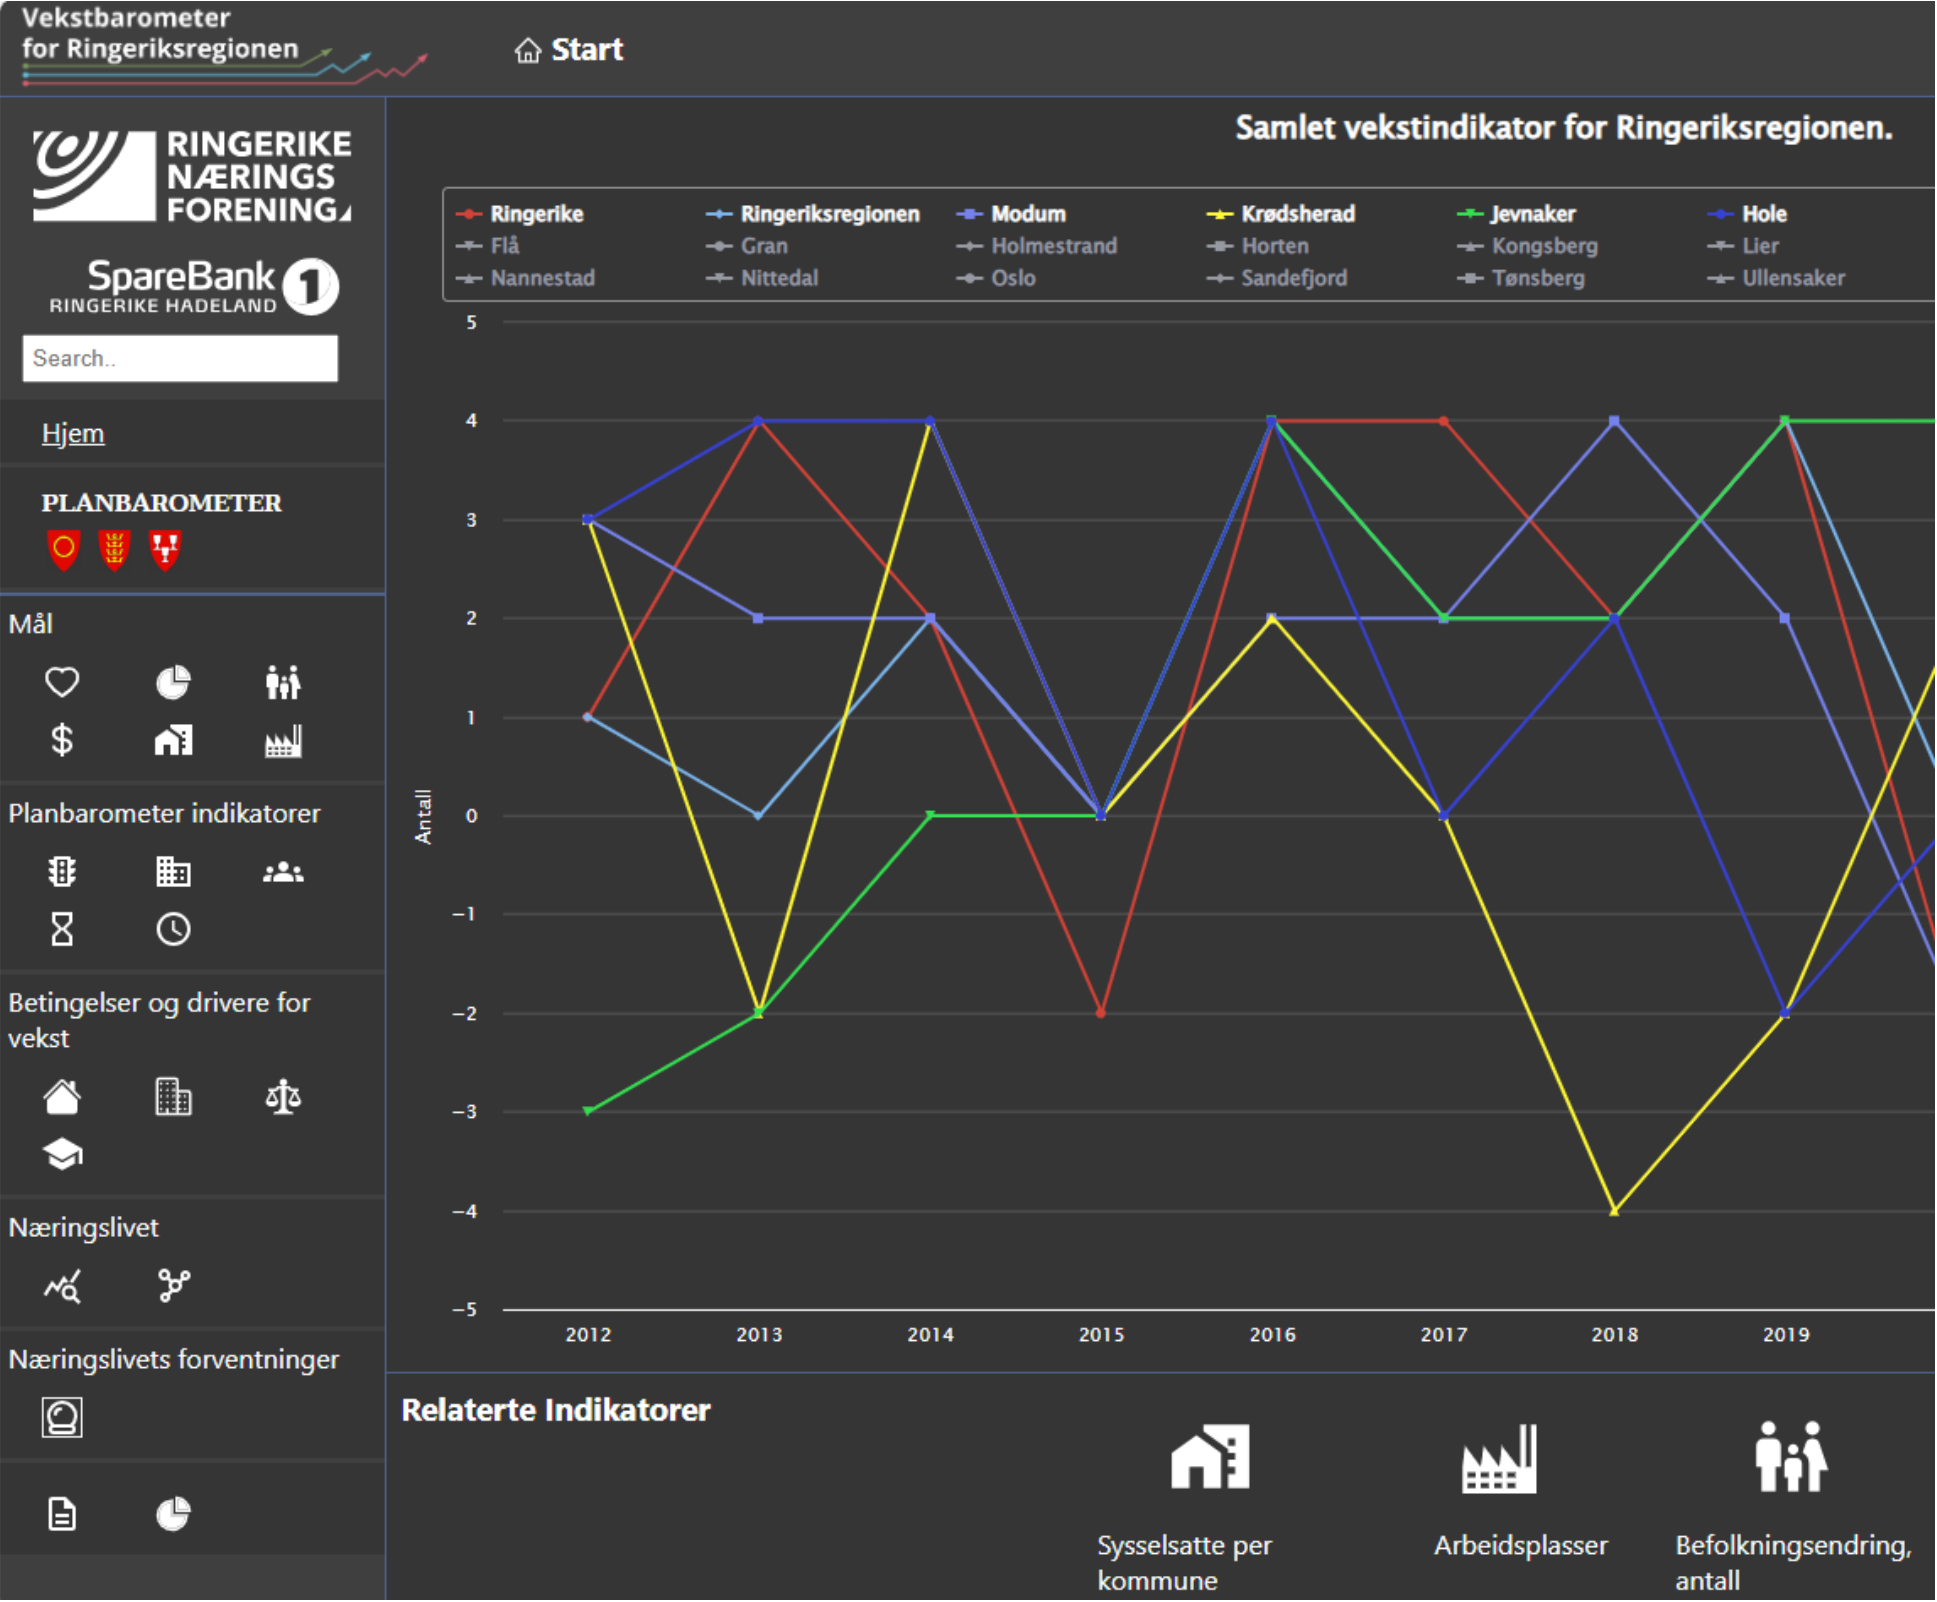

[Planbarometer | USN](#)

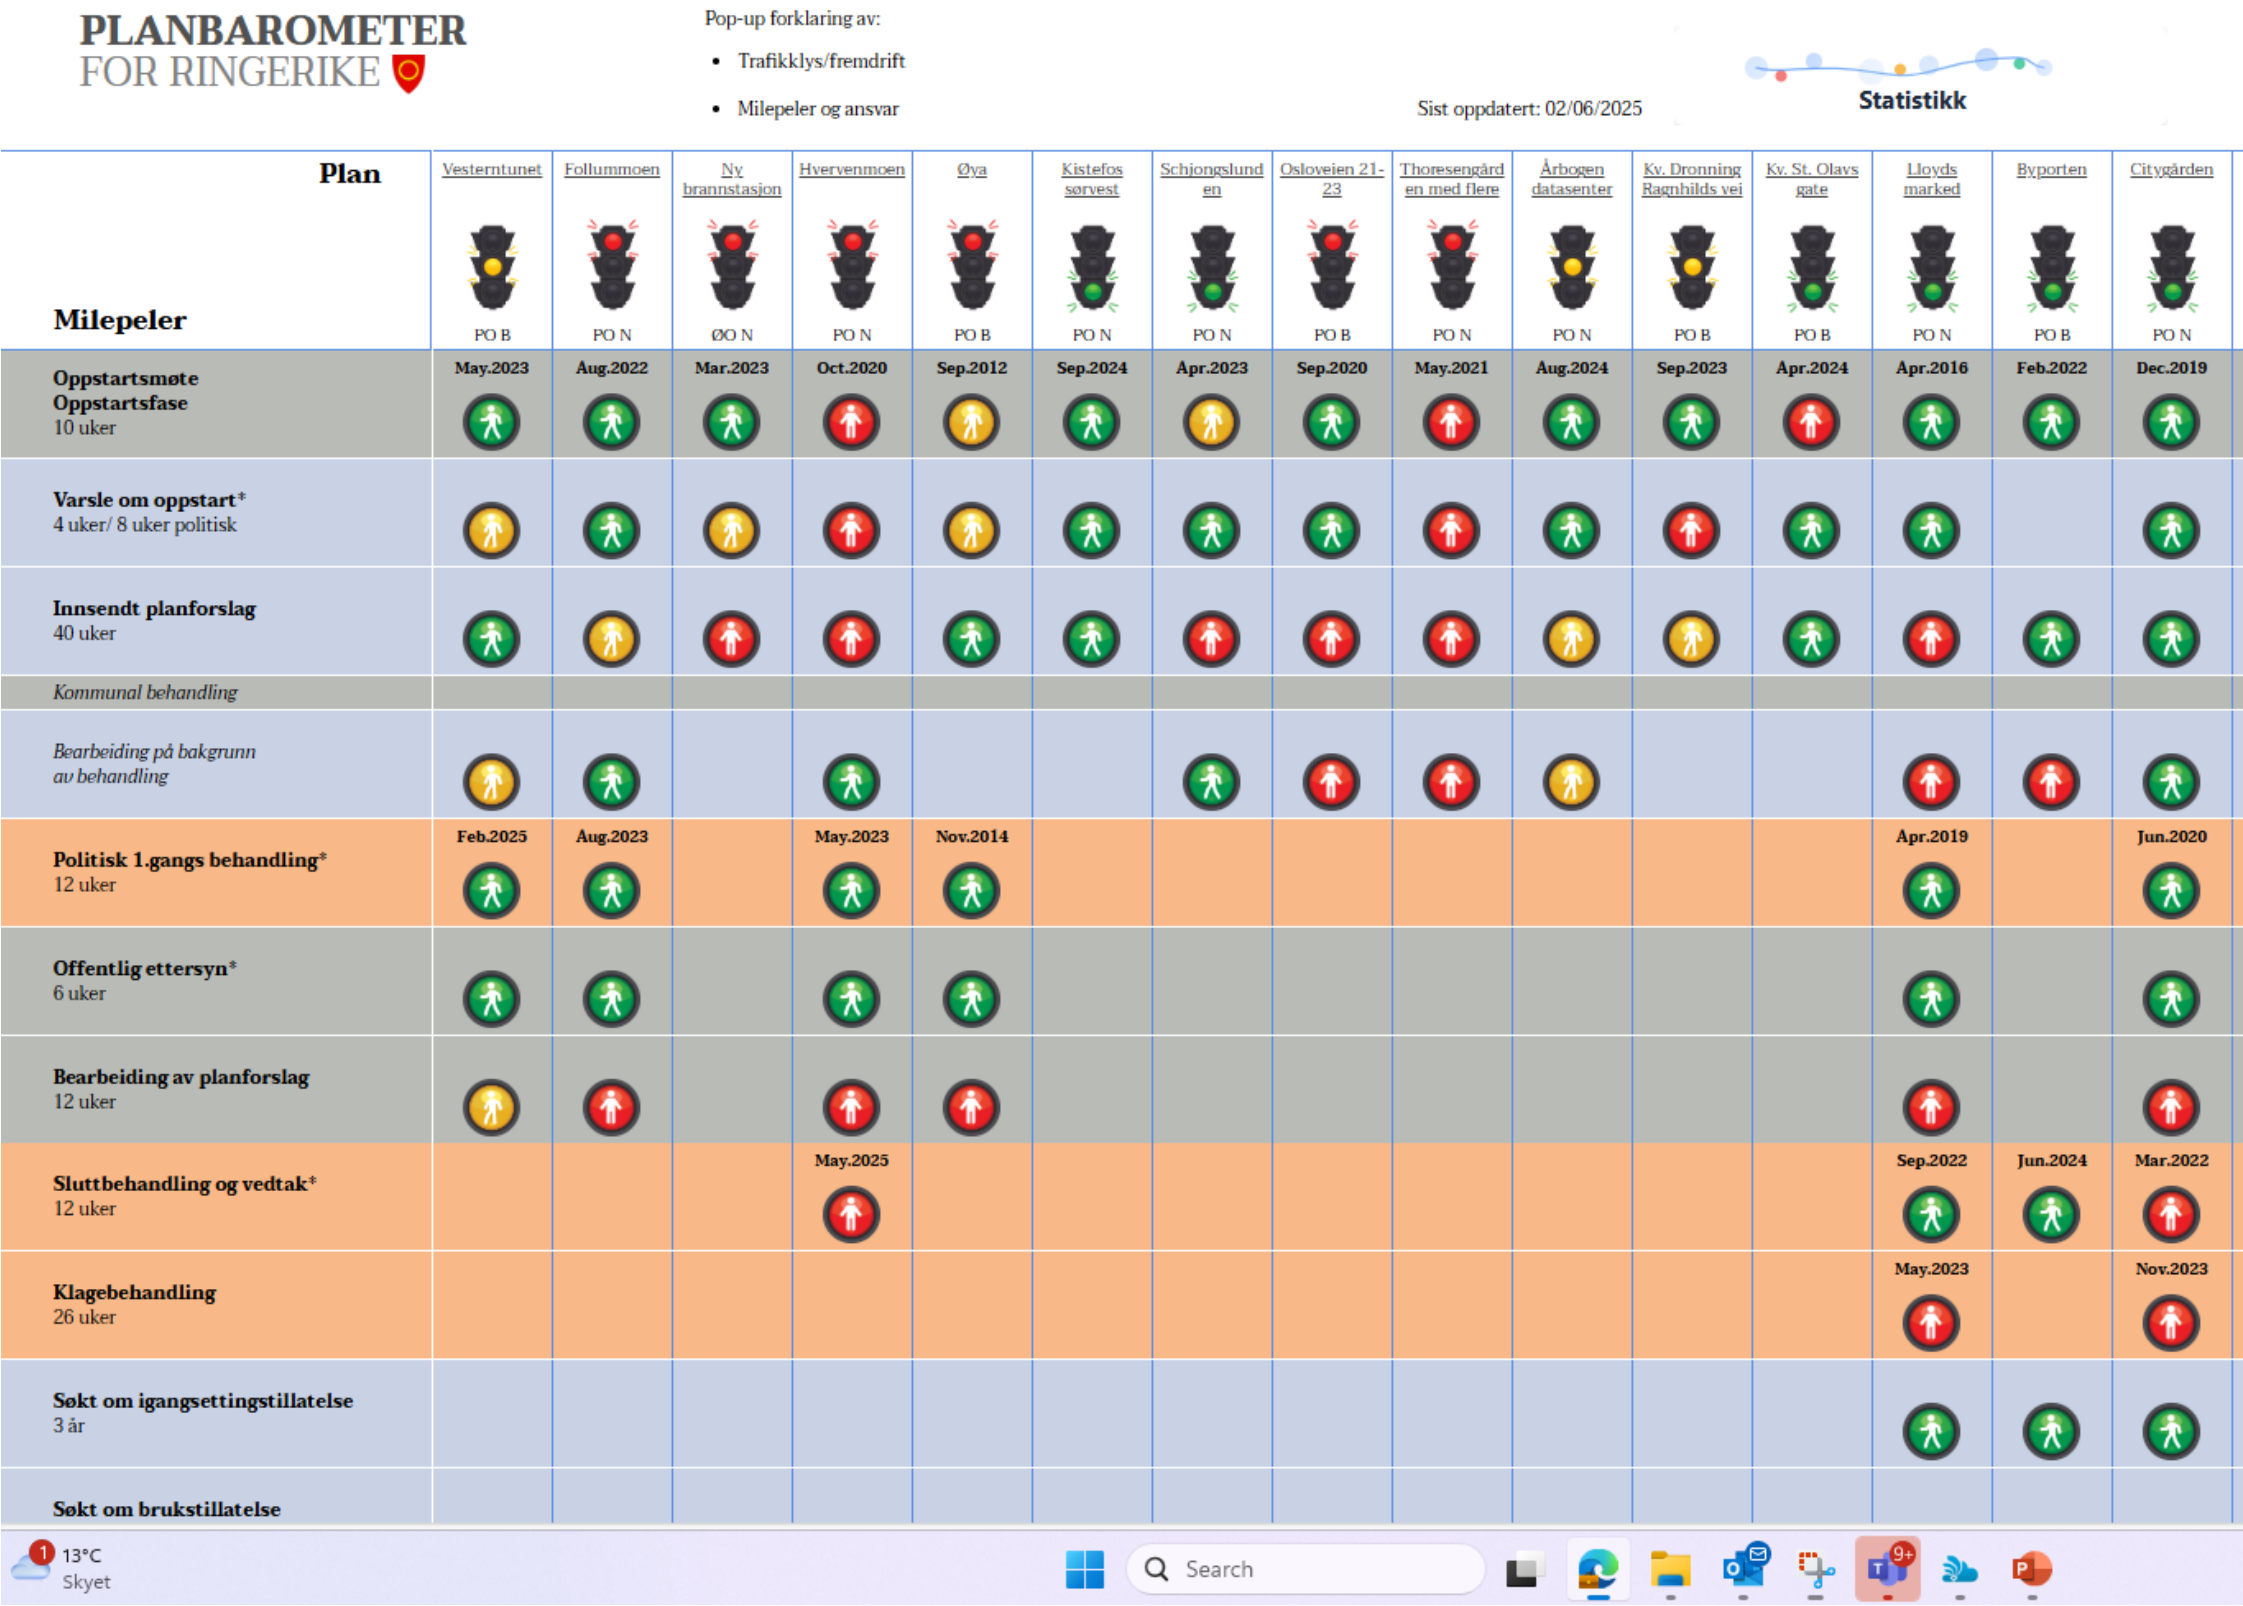

Planbarometeret

PLANBAROMETER
FOR RINGERIKE

Pop-up forklaring av:

- Trafikkllys/fremdrift
- Milepeler og ansvar

Sist oppdatert: 02/06/2025



Plan	Vestertunet	Follummoen	Ny brannstasjon	Hvervenmoen	Øya	Kistefos sørvest	Schiøngslund en	Osloveien 21- 23	Thoresengård en med flere	Årbøen datasenter	Kv. Dronning Ragnhilds vei	Kv. St. Olavs gate	Lloyds marked	Bytorsten	Citygården	Hønergata øst	Nordre Park Boligsameie	Børdalsmoen	Eikli park	Blybergshaug en	Vestsiden miljøpark	Løkenåsen	Tyrimyra	Kv. Hønergata og Hauges gate	Krokeniveien 25-33	Tanbergdansen	Arnegårdshak ken	Ådalsveien Dagligvare
Milepeler																												
Oppstartsmøte Oppstartsfase 10 uker	May.2023 	Aug.2022 	Mar.2023 	Oct.2020 	Sep.2012 	Sep.2024 	Apr.2023 	Sep.2020 	May.2021 	Aug.2024 	Sep.2023 	Apr.2024 	Apr.2016 	Feb.2022 	Dec.2019 	Sep.2011 	Jun.2020 	Oct.2024 	Feb.2023 	Oct.2023 	Sep.2022 	Aug.2021 	Oct.2023 	Oct.2024 	Jun.2021 	Aug.2022 	Apr.2021 	Jan.2021
Varsle om oppstart* 4 uker/ 8 uker politisk																												
Innsendt planforslag 40 uker																												
Kommunal behandling																												
Bearbeiding på bakgrunn av behandling																												
Politisk 1.gangs behandling* 12 uker	Feb.2025 	Aug.2023 		May.2023 	Nov.2014 								Apr.2019 		Jun.2020 	Jun.2014 	Nov.2023 				Jan.2025 				Mar.2024 	Jun.2023 	Aug.2023 	Aug.2023
Offentlig ettersyn* 6 uker																												
Bearbeiding av planforslag 12 uker																												
Sluttbehandling og vedtak* 12 uker				May.2025 									Sep.2022 	Jun.2024 	Mar.2022 	Jan.2019 									Feb.2025 	Apr.2025 	Feb.2024 	Apr.2025
Klagebehandling 26 uker													May.2023 		Nov.2023 													
Søkt om igangsettingstillatelse 3 år																											Dec.2024 	
Søkt om brukstillatelse 8 uker																												

Hva kan vi se?



Kategoriserer planen etter:

- Bolig/næring
- Prioritert/øvrig område



Forklaring av
lyssettingen

- ▶ Grønn figur; prosessen har god fremdrift
- ▶ Gul figur; prosessen er i ferd med å overskride estimert tidsbruk
- ▶ Rød figur; prosessen har overskredet estimert tidsbruk



Viser innholdet i planen:

- Antall boenheter
- Antall m² næringsarealer



Hvem har ansvaret?

FORSLAGSSTILLER

KOMMUNEN

POLITISK

* Tidsplan regulert av PBL.

Årsak til
overskredet
tidsbruk




Statistikk

PLANBAROMETER
FOR RINGERIKE

- Pop-up forklaring av:
- Trafikklys/fremdrift
 - Milepeler og ansvar

Sist oppdatert: 02/06/2025



Plan	Vesterntunet	Follummoen	Ny braustasjon	Hvervenmoen	Øya	Kistefos sørvest	Schjongsland en	Osloveien 21- 23	Thoresengård en med flere	Årbogen datasenter	Kv. Dronning Ragnhilds vei	Kv. St. Olavs gate	Lloyds marked	Byporten	Citygården	Hønergata øst	Nordre Park Boligsameie	Bordalsmoen	Eikli park	Blybergshaug en	Vestsiden miljøpark	Løkenåsen	Tyrinnyra	Kv. Hønergata og Haugs gate	Krokenveien 25-33	Tanbergdansen	Arnegårdsbak ken	Ådalsveien Dagligvare	
Milepeler																													
Oppstartsmøte Oppstartsfase 10 uker	May.2023 	Aug.2022 	Mar.2023 	Oct.2020 	Sep.2012 	Sep.2024 	Apr.2023 	Sep.2020 	May.2021 	Aug.2024 	Sep.2023 	Apr.2024 	Apr.2016 	Feb.2022 	Dec.2019 	Sep.2011 	Jun.2020 	Oct.2024 	Feb.2023 	Oct.2023 	Sep.2022 	Aug.2021 	Oct.2023 	Oct.2024 	Jun.2021 	Aug.2022 	Apr.2021 	Jan.2021 	
Varsle om oppstart* 4 uker/ 8 uker politisk																													
Innsendt planforslag 40 uker																													
Kommunal behandling																													
Bearbeiding på bakgrunn av behandling																													
Politisk 1.gangs behandling* 12 uker	Feb.2025 	Aug.2023 		May.2023 	Nov.2014 								Apr.2019 		Jun.2020 	Jun.2014 	Nov.2023 				Jan.2025 				Mar.2024 	Jun.2023 	Aug.2023 	Aug.2023 	
Offentlig ettersyn* 6 uker																													
Bearbeiding av planforslag 12 uker																													
Sluttbehandling og vedtak* 12 uker				May.2025 									Sep.2022 	Jun.2024 	Mar.2022 	Jan.2019 									Feb.2025 	Apr.2025 	Feb.2024 	Apr.2025 	
Klagebehandling 26 uker													May.2023 		Nov.2023 														
Søkt om lgangsettingstillatelse 3 år																												Dec.2024 	
Søkt om brukstillatelse 8 uker																													

Statistikk


- Utvalgt statistikk bygger på informasjon fra barometeret
- Flere målepunkter i fremtiden
- Mulighet for sortering



Samlet planprosetid for sluttbehandlede planprosesser




Total Planstatus



Antall saker næring og bolig



Samlet planprosetid for alle planprosesser

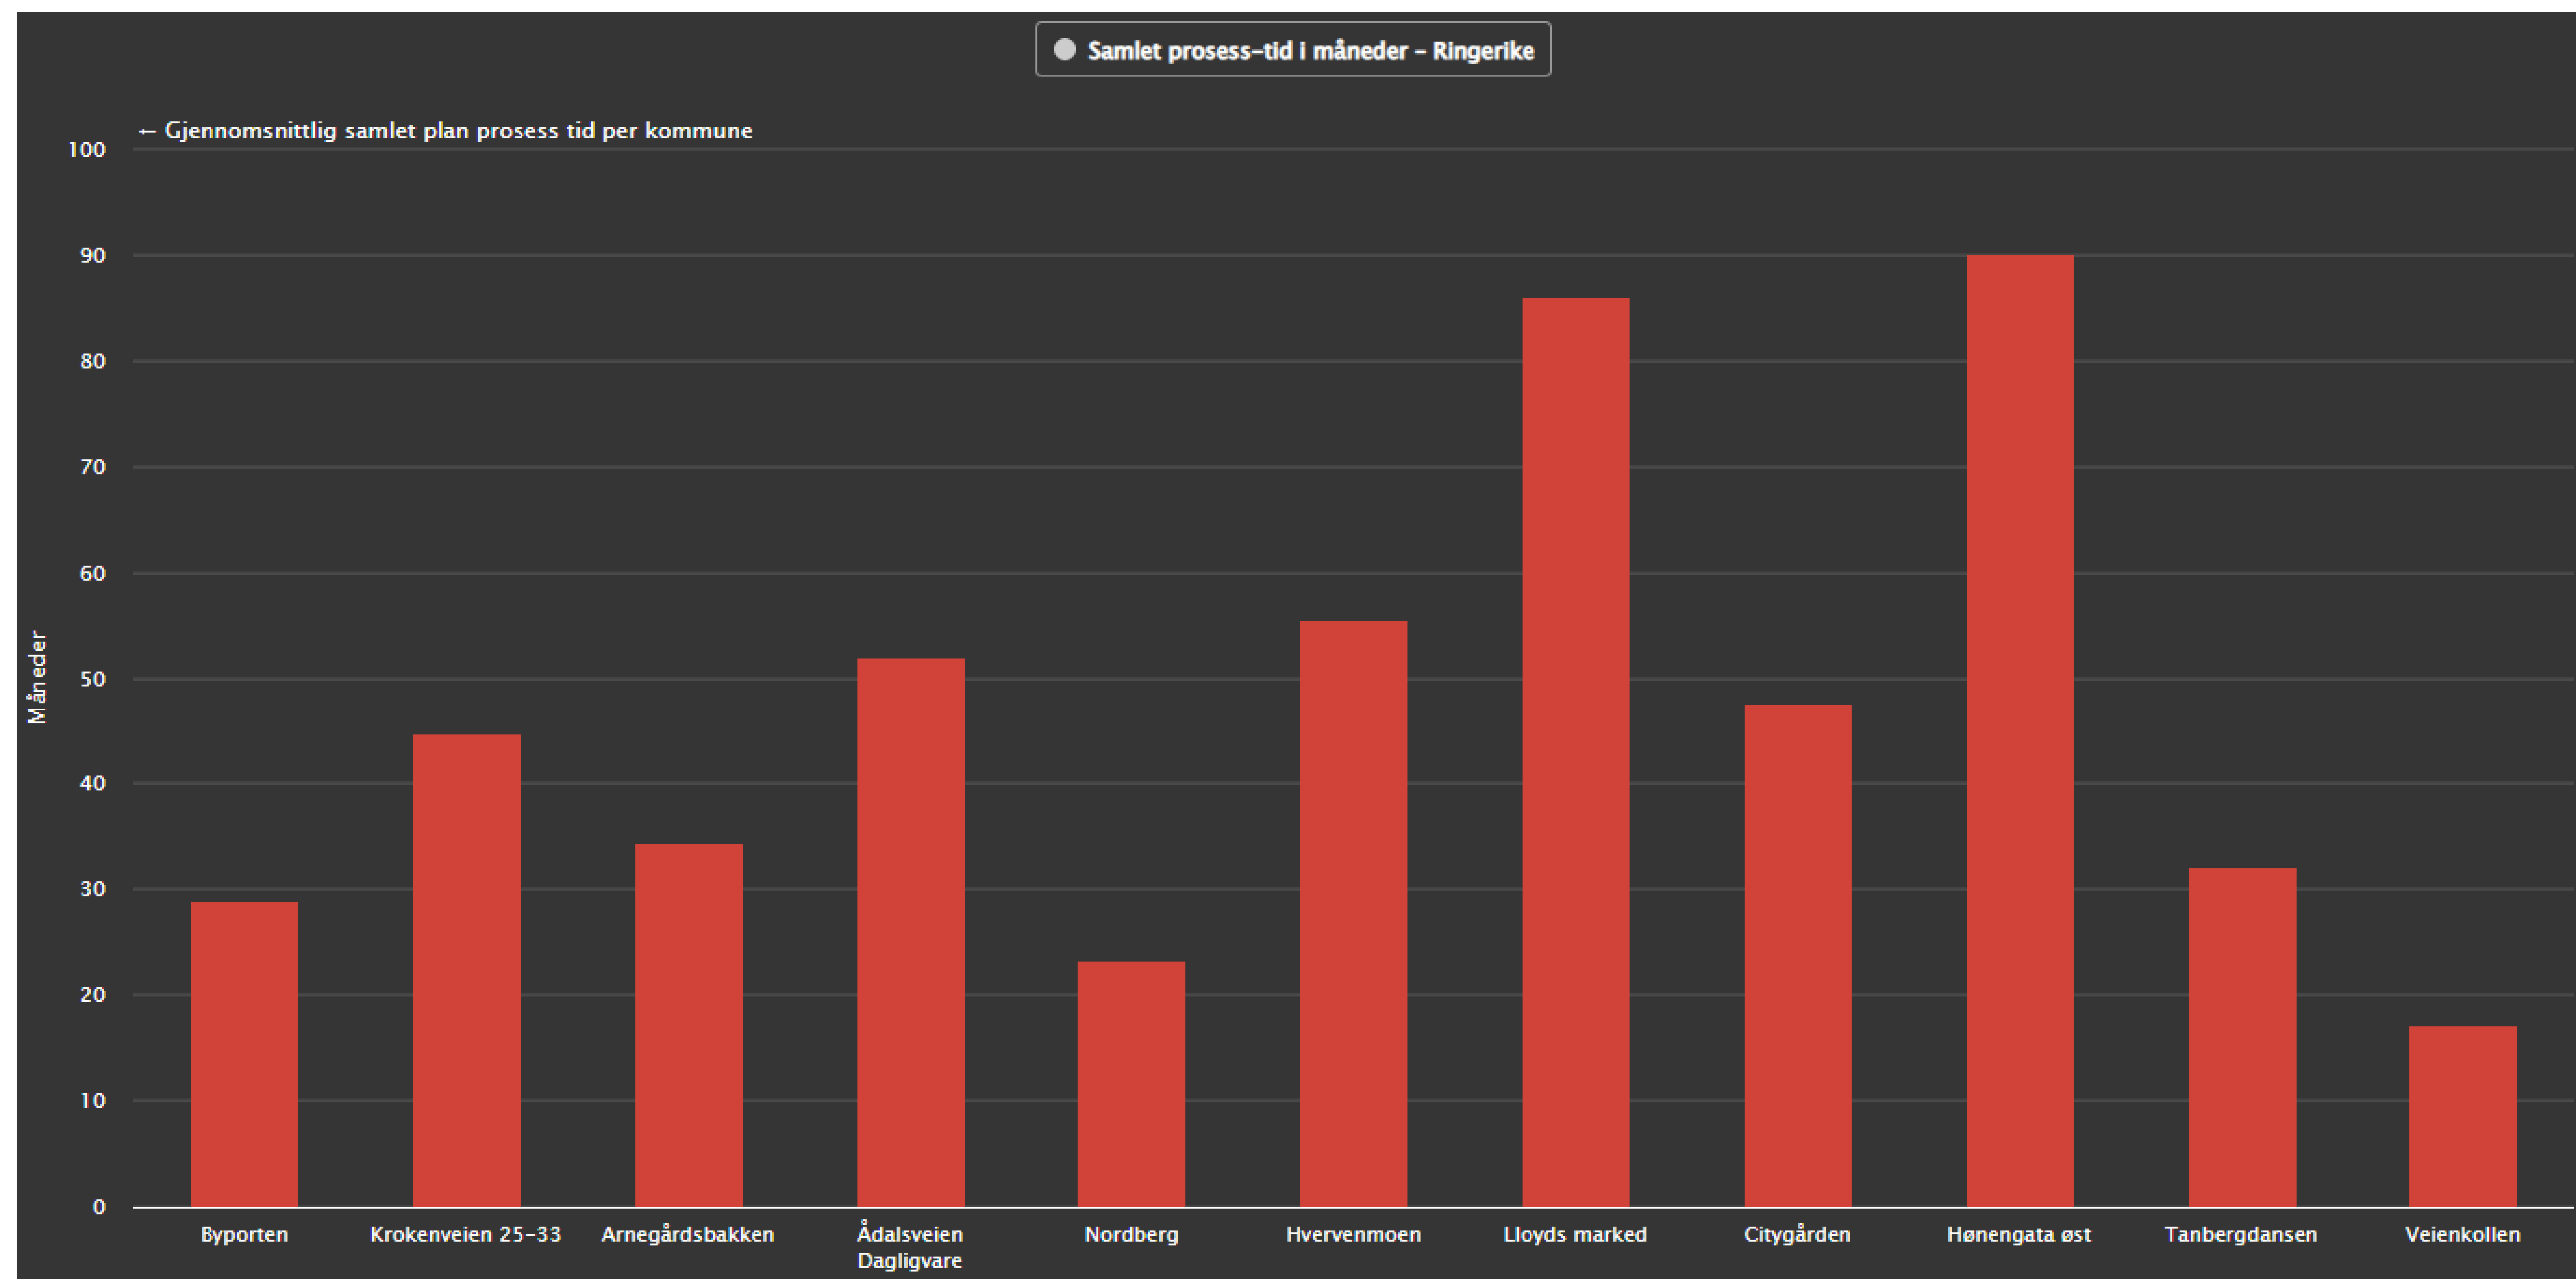

Planbarometeret


PLANBAROMETER
FOR RINGERIKE



Pop-up forklaring av:

- Trafikklys/fremdrift
- Milepeler og ansvar

Sist oppdatert: 02/06/2025



Statistikk

Vekstbarometer
for Ringeriksregionen



Plan	Vesterntunet	Follummoen	Ny brannstasjon	Hvervenmoen	Øya	Kistefos sørvest	Schiøngslund en	Osloveien 21- 23	Thoresengård en med flere	Årbogen datasenter	Kv. Dronning Ragnhilds vei	Kv. St. Olavs gate	Lloyds marked	Byporten	Citygården	Hønenegata øst	Nordre Park Boligsameie	Børdalsmoen	Ekli park	Blybergshaug en	Vestsiden miljøpark	Løkenåsen	Tyrinmyra	Kv. Hønenegata og Hauges gate	Krokenveien 25-33	Tanbergdansen	Arnegårdshak ken	Ådalsveien Dagligvare	
Milepeler																													
Oppstartsmøte Oppstartsfase 10 uker	May.2023 	Aug.2022 	Mar.2023 	Oct.2020 	Sep.2012 	Sep.2024 	Apr.2023 	Sep.2020 	May.2021 	Aug.2024 	Sep.2023 	Apr.2024 	Apr.2016 	Feb.2022 	Dec.2019 	Sep.2011 	Jun.2020 	Oct.2024 	Feb.2023 	Oct.2023 	Sep.2022 	Aug.2021 	Oct.2023 	Oct.2024 	Jun.2021 	Aug.2022 	Apr.2021 	Jan.2021 	
Varsle om oppstart* 4 uker/ 8 uker politisk																													
Innsendt planforslag 40 uker																													
Kommunal behandling																													
Bearbeiding på bakgrunn av behandling																													
Politisk 1.gangs behandling* 12 uker	Feb.2025 	Aug.2023 		May.2023 	Nov.2014 								Apr.2019 		Jun.2020 	Jun.2014 	Nov.2023 				Jan.2025 				Mar.2024 	Jun.2023 	Aug.2023 	Aug.2023 	
Offentlig ettersyn* 6 uker																													
Bearbeiding av planforslag 12 uker																													
Sluttbehandling og vedtak* 12 uker				May.2025 									Sep.2022 	Jun.2024 	Mar.2022 	Jan.2019 									Feb.2025 	Apr.2025 	Feb.2024 	Apr.2025 	
Klagebehandling 26 uker													May.2023 		Nov.2023 														
Søkt om igangsettingstillatelse 3 år																											Dec.2024 		
Søkt om brukstillatelse 8 uker																													
